


Taivalkosken kunta

Taivalkosken monitoimireittien kehittämishanke 2021 - 2024

LOPPURAPORTTI

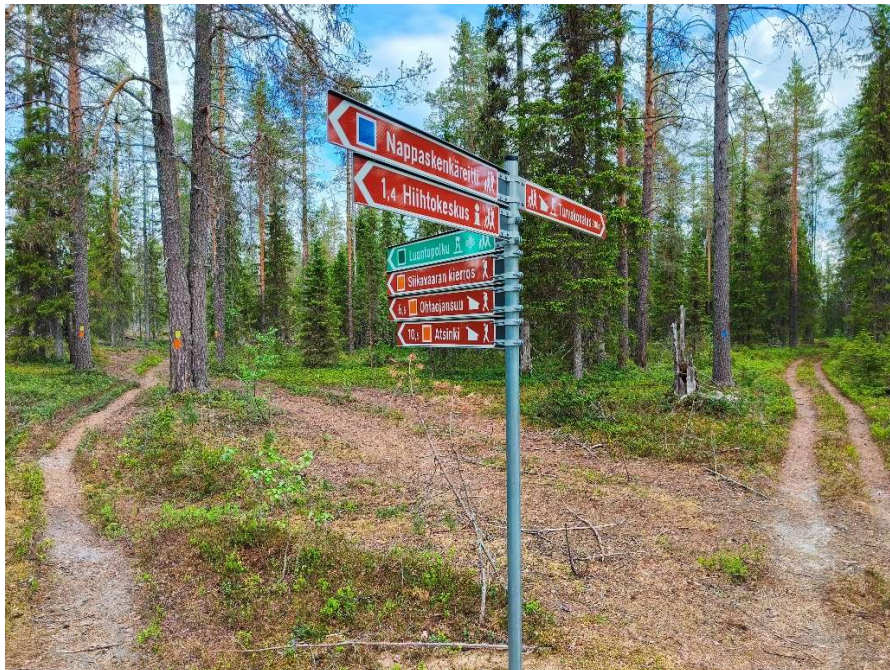

Kehittämishankehakemus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle (Maaseuturahasto) 30.11.2020

1. Hankkeen toteuttaja

Taivalkosken kunta

2. Hankkeen nimi ja hanketunnus

TAIVALKOSKEN MONITOIMIREITTIENTEN KEHITTÄMISHANKE

Hankennumero 150814

Vireilletulopäivä 30.11.2020, päätös 29.6.2021, toteutusaika 4.1.2021 - 31.10.2023,

Muutoshakemus, päätös 24.5.2023 ja

Jatkoaikahakemus 31.8.2024 saakka, päätös 27.10.2023

3. Yhteenveto hankkeesta

Taivalkoski tunnetaan luonto- ja liikuntamatkailumahdollisuuksistaan. Kunnan alueella on runsaasti eri aikakausina toteutettuja reittejä ja taukopaikkoja, joista osan ylläpito ei ole ollut riittävää. Reiteiltä odotetaan monikäyttöisyyttä, saavutettavuutta, osin helppokulkuisuutta ja esteettömyyttä sekä kattavaa opastusta.

Taivalkosken luonto- ja liikuntamatkailun kehittämissuunnitelmassa (kunta, matkailuyhdistys, Naturpolis, KAMK) sekä muissa työpajoissa ja kunnan ja matkailuyhdistyksen omassa kartoitustyössä tunnistettiin reitteihin liittyviä kehittämistarpeita.

Taivalkosken liikuntapaikkastrategian 2020 kyselyjen perusteella luontoliikunnalla on iso merkitys paikalliskunnan matkailulle ja paikkakuntalaisille. Kaikissa, paitsi koululaisille suunnatussa, kyselyissä tärkeimmäksi nousi reitistöjen merkitys. Suurimmiksi ongelmiksi koetaan puutteellinen reittiopastus - keskeisten paikkojen opastaulut, viitat, reittimerkinnot ja reittikartat – sekä reittien kunnossapito.

Hankerahakemuksessa vastattiin ilmenneisiin kehittämiskohteisiin. Hankerahoituksen turvin kunnostettiin merkittävä osa reittejä mm. kestävästi. Opastus ajanmukaistettiin korvaamalla huonokuntoiset puuviitat metalliviitoin ja teettämällä uusia ohje- ja opastustauluja sähköisin vieraskirjoin ja palautelinkin. Samoin nopeasti muuttuvat tiedot ovat nyt linkkien takana.

Hanke suunniteltiin kunnan eri toimialojen ja matkailutoimijoiden yhteistyönä. Hankkeen toteutti Taivalkosken kunnan Tekniset palvelut.

4. Raportti

4.1. Hankkeen tavoitteet

4.1.1. Ylemmän tason tavoitteet

Ohjelma: Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 – 2020 (siirtymäkausi 2021 – 2022)
Ohjelman toimenpide: 7.5 Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
Ohjelman alatoimenpide: Vapaa-aika ja matkailuinvestoinnit
Hankkeen toteutusalue: Paikallinen/Alueellinen

4.1.2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoite on toteuttaa Taivalkosken kunnan ylläpitämien luontoliikuntareittien kokonaisvaltainen uudistus ja päivittää ne vastaamaan nykyajan vaatimuksia. Toimenpiteillä parannetaan reittiverkoston näkyvyyttä, saavutettavuutta, käyttöturvallisuutta ja monikäyttöisyyttä.

Tavoitteena on valita kehittämiskohteet niin kansainvälisen matkailun kuin paikallisten liikkumisen näkökulmasta ja selkeyttää reittiverkostoa. Keskeistä on myös olemassa olevien reittien käyttötapojen monipuolistaminen käyttäjäturvallisuus huomioiden.

Reittien kehittämisellä lisätään Taivalkosken ja sen kylien alueellista kiinnostavuutta, tuoden esille laajan pitäjän omaleimaisia piirteitä sekä parantaen maaseudun pienten yritysten toimintaedellytyksiä. Reittien kehitys ja infrastruktuurin parantaminen tarjoaa Taivalkosken vakituksille- ja vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille entistä parempia virkistys- ja lähiliikunta-alueita sekä tarjoaa puitteita maaseudun yrityksille kehittää luontoon liittyvää liiketoimintaa ja kehittää sitä kautta haja-asutusalueiden tasa-arvoisuutta.

4.2. Toteutus

4.2.1.Toimenpiteet

4.2.2.Aikataulu

Toimenpide	Toteuttaja	Ajankohta	Lisätietoja
Opastusviitoitus, lähireitit			
- Suunnittelu	Suomen Maastotieto	elo-syysk. 2021	
- Kilpailutus, Clouidia	Sauso, tarjouksia 4	toukokuu 2022	
- asentaminen	oma työ	syksy 2022	Opastuspisteitä 70 kpl, 79 nimi- ja 68 suuntaviittaa
Opastusviitoitus, pitkät reitit			
- suunnittelu	oma työ	kevät 2023	
	viitat Sauso 2023 tarjouksen hinnoin		
- asentaminen	oma työ	syys-lokak 2023	Uusia opastuspisteitä 80 kpl, 70 nimi- ja 105 suuntaviittaa
Varoitus- ja ohjeistustaulut	Sauso	syys-lokak 2023	Jaettu reitti ja vaarallinen lasku kylttejä yht 24 kpl
Simosenpolun tarinataulut			
- suunnittelu	Tekstit Jorma Räisänen, käännökset Translatiom/Säde Kangasniemi, kuvat Jussi Valtakari ja nuoriso	talvikausi 2021-22	
- kilpailutus/valmistaminen	Ouvel, tarjouksia 6	helmik/heinäk 2023	6 kpl, kaikki erilaisia 400x600 mm
- telineiden rakentaminen ja asentaminen	oma työ	elokuu 2023	
liijoki Jokijärvi-Taivalkoski koskien nimi-kylttien asentaminen	KJ-Experience, tarjouksia 2 kpl. Kyltit tehty aiemmin	syyskuu 2022	Kylttejä 18 kpl
Opastustaulut Jokijärvi ja Keskusta	Oulun Mainoskeskus, 1 tarjous määräajassa		
- suunnittelu		talvikausi 2023-24	7 + 6 kpl
- asentaminen	oma työ	elokuu 2024	Metallitelineet, 2 puutelineet
Laavujen taulut			
- suunnittelu	Mainoskeskus	kevät 2024	15 kpl, laavujen seiniin tai viittavarsiin
- asentaminen	oma työ	syyskuu 2024	
Jokijärven vanhojen taulujen uudet telineet	oma työ	elokuu 2024	4 kpl, puutelineet
Simosenpolun pitkokset			
- hankinta ja moottorikelkalla siirto	FM-Timber, oma työ	huhtikuu 2022	1130 m 2-lankkuista, 1260 m 3-lankkuista
- asentaminen	oma työ	kesä-heinäk 2022	
- reittimuutos myrskytuhoon vuoksi	oma työ	kesä 2023	310 m
- lisähankinta 4000,-/716 m	tarvikkeet FM-Timber, työ kirjattu muualle	kevät 2024	170 m Kantoniemi, ei aiemmin mahdollinen myrskypuiden vuoksi
Kantoniemen niittysauna-alueen kunnostaminen: kulkuväylät, nuotiopaikka, saunan katto ja nostaminen	oma työ, murskeen lastaus Saija, puutavara niittysaunaan Taivalbetoni/Ilpo Vanhala	huhtik/kesäk 2023	
Salmisenkankaan sorastus kesätyönä	oma työ, mönkijä- ja lastausurakoitsija Taivalbetoni/Ilpo Vanhala	heinä-elokuu 2023	1400 m
Harjajärven Väliojan sillan jatkaminen	oma työ	elokuu 2023	
Kivivaaran louhikon sorastus ja lankutus	oma työ, Taivalbetoni/Ilpo Vanhala	elokuu 2023	60 m
Nappaskenkäreitin pitkokset, hankinta, siirto ja asentaminen	Puutavara Lakkapää, oma työ	huhtik/heinäk 2023	550 m 3-lankkuista
Kylmäpuron silta ja portaat			
- tarvikehankinta	Puukeidas	kesä 2023	
- rakentaminen	Maarakennus Vääräniemi, oma työ	heinäkuu 2024	
Alaväkevän portaat (Lähireittien kunnostaminen)	oma työ, puutavara 2023 hankinnasta	elokuu 2024	

4.2.3.Resurssit

4.2.4.Toteutuksen organisaatio

Hankesuunnitteluvaiheessa tarkoitus oli palkata tarvittavaksi ajaksi suunnittelija ja työnjohto sekä työntekijöitä. Hankkeelle ei palkattu erillisiä työntekijöitä vaan hanketyön tekivät kunnan määräaikaiset työntekijät rinnan muiden töiden kanssa. Tunnit kirjattiin hankkeelle työntekijöiden Nepton-tuntikirjanpidon mukaan. Erillistä suunnittelu- ja työnjohtohenkilöstöä ei palkattu, vaan nämä toteutettiin kunnan omalla henkilöstöllä ja limittyi muun työn kanssa. Ei tuntikirjanpitoa, eikä hankkeelle kirjattuja kustannuksia. Tältä osin kustannusarvio alittui ja kustannukset jäivät kunnalle.

Valikoitunut malli antoi aikaa töiden suunnittelulle edeltävien töiden mukaan ja reagoimiseen muuttuviin tilanteisiin sekä oppimiselle ja sisäistämiselle mutta aiheutti myös kiirettä ajoittain.

4.2.5.Kustannukset ja rahoitus

Henkilöstökulut	hakemus	toteuma
- suunnittelija/ohjaaja	46 400	
- rakennustyöntekijä	58 000	25 985
Materiaalit	60 700	117 430
Ostopalvelut ja omat konetyöt	20 500	18 100
Matkat	14 400	5 650
Yhteensä	200 000	167 165
Hallinnointi- ja yleiskulut 5%		8 358
		175 523
Rahoitus		
- Maaseuturahasto	140 000	122 866
- Taivalkosken kunta	60 000	52 657

4.2.6.Raportointi ja seuranta

Hankkeen kustannuksia seurattiin sille perustetulla kustannuspaikalla. Ohjausryhmää ei hankepäätöksenkään mukaan perustettu.

4.2.7.Toteutusolelut ja riskit

Hankepäätöksen kanssa samoihin aikoihin osunut Paula-myrsky vaikutti merkittävästi hankkeen toimenpiteiden kohteisiin ja aikatauluihin. Tämän vuoksi jouduttiin hakemaan muutoksia toteutaviin kohteisiin ja hakemaan jatkoaikaa hankkeen toteuttamiselle.

Muutospäätöksen perustelut:

- 1) Hankesuunnitelman jälkeen tapahtunut Paula-myrsky aiheutti mm Harjajärven seudulla mittavat tuhot. Maanomistaja Metsähallitus on ilmoittanut, että puunkorjuu valtaosalta aluetta ei maaston vuoksi ollut koneellisesti mahdollista sitä vuodenvaihteessa 2022-23 yritettäessä. Täten pitkosten kunnostaminen alueelle ei tällä hetkellä ole järkevää, vaan reitti ohjataan ainakin toistaiseksi viereisellä olemassa olevalle pyöräreitille.

2) Uutena kohteena kunnostetaan Nappaskenkäreitän pitkokset. Reitti on rakennettu vuosina 2011 ja 2012.

3) Salmisenkankaan osin talvityöksi suunniteltu kestäväyttäminen toteutetaan täysin kesätyönä.

4) Kivivaaran reitin kulkukelpoisuuden ja turvallisuuden parantamiseen suunniteltu sorastus korvataan puurakenteella.

Jatkoaikahakemuksen perustelut (Hakemuksen vireilletulopäivä 28.3.2023):

- Tukipäätös saapui 29.6.2021. Alueellemme voimakkaana 22.6.2021 osunut Paulamyrsky tuhosi laajasti hankkeen kohdealueita ja sen korjuutoimet muutoinkin veivät hankkeen toteuttajien ajan ja voimavarat ensimmäisenä toteutuskesänä. Kesäkausiin painottuvat suunnittelu- ja toteuttamistyöt siirtyivät vuodelle.
- Jatkoaikaa haetaan tukihakemuksen 232618 ja siihen haetun muutoshakemuksen 335937 mukaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Hankkeen valmiusaste n 80%. Toteuttamatta ovat Kylmäpuron silta ja osa opasteista.

Reittilinjauksissa on edelleen ratkaisemattomia kohtia ja painetut aineistot vanhenisivat nopeasti. Hankesuunnitelmassa esitetystä poiketen hankkeessa jätettiin toteuttamatta:

- Isojen opastustaulujen asentaminen
- Opastetaulut reittien varrelle

4.3. Yhteistyökumppanit ja viestintä

Hankkeen toteutusaikana tehtiin yhteistyötä ja tarpeen mukaan kokoonnuttiin mm seuraavien kanssa:

- Taivalkosken kunnan liikuntapalvelut
- Taivalkosken matkailuyhdistys ja matkailuyrittäjät
- Naturpoliksen matkailu- ja yrityskehittäjät
- Metsähallitus
- Jokijärven kyläseura
- Tää on mulle tärkeä -hanke

Hankkeen toteutukseen osallistuneet yritysyhteistyökumppanit ilmenevät toimenpidetaulukosta.

Viestintä painottui sosiaaliseen mediaan: hanke toimenpiteineen näkyvästi esillä etenkin Taivalkosken ladut ja luontoliikunta -facebook-ryhmässä. Paikallislehdessä ensimmäisen vuoden jälkeen artikkeli hankkeesta ja hanketta sivuttiin tai se näkyi muutamissa muissa artikkeleissa. Hanketta ja sille saatavaa EU-tukea esittelevät julisteet olivat Taivalkosken kunnan valtuustosalin ja Vapaa-aika-toimen käytävän ilmoitustauluilla. Tuotetuissa tauluissa on maaseuturahaston logo.

4.4. Tulokset ja vaikutukset

Hankkeen toimenpiteillä saatiin kunnostettua merkittävä osa reittiverkoston huonokuntoisia osia ja kohteita niitä kestäväyttäen ja rakenteita uudistaen. Reittien käytettävyyttä ja monikäyttöisyyttä parannettiin rakentamalla osin aiempaa leveämpiä pitkoksia ja kunnostamalla vaikeakulkuisia kohtia erilaisin rakentein. Jokijärven Simosenpolkua elävöitettiin uusin kohdetauluin.

Reittiverkoston näkyvyys parani toteutetuin opastauluin ja viitoituksin, mikä vaikuttaa merkittävästi myös käyttöturvallisuuteen. Tauluihin liitetyt qr-koodit (palaute, vieraskirja ja linkit karttoihin ja palveluihin) myös lisäävät käyttöturvallisuutta ja saavutettavuutta.

Kokonaistuloksena oli selkeä reittiverkoston tason nousu.

Oppimisloikka tapahtui ainakin seuraavissa asioissa:

- Opastus/viitoitus: ostopalveluna hankittu ensimmäinen suunnitelma tuotti mallin, jota voitiin hyödyntää jatkosuunnittelussa hankkeen aikana ja hyödynnetään edelleen
- Opastuksen ja tiedottamisen ajantasaistaminen ja nykyaikaistaminen
- Syvällinen reittien tuntemus, koska toimijat ovat viime aikoina vaihtuneet ja kaikki tieto/osaaminen ei ollut siirtynyt
- Rakentamistaidot, kunnostusosaaminen, ennakointi
- Hankinnat ja kilpailuttaminen

Hankkeen rinnalla, omana työnä, hankkeessa opittua hyödyntäen tapahtunutta:

- Latuviitoituksen uudistaminen
- Outdooractive-järjestelmän ylläpitäjille tiedon tuottaminen
- Reittitietojen päivittäminen Lipakseen

5. Esitykset jatkotoimenpiteiksi

Reitistön suunnitelmallista kunnossapitoa ja kunnostusta jatketaan ja varataan siihen riittävä resurssi.

Ehdotuksia kunnostuskohteiksi: Kylmäluoman suunta, uusi taukopaikka välille Susijärvi-Kylmäluomajärvi, helpohkot pyöräreitit, koskimerkit myös alajuoksulle, Pakkakurun alue.

Kunnossapidon tueksi on aiemmin luotu manuaalinen kirjaamisjärjestelmä, mutta sähköisen sovelluksen käyttöönottoa on hyvä harkita. Kunnossapitotoimista laaditaan kirjalliset ohjeet.

Toteuttamatta jätetyt opastetaulut toteutetaan uuden ajankohtaisen suunnitelman mukaan.

Kunnan omien sivujen reittitietojen kattavuus varmistetaan.

Verkostoyhteistyötä kehitetään reittitietojen tuottajien kanssa (mm. paljon käytetyissä selaimen Retki-kartassa ja mobiilin Karttapaikassa on vanhentunutta tietoa johtuen järjestelmien käyttämistä tietolähteistä)

6. Allekirjoittajat ja päiväys

Taivalkoskella 28.11.2024


Varpu Paakinaho-Heikkinen
Tekninen johtaja

Ulla Majava
Yhdyskuntatekniikan suunnittelija

KUVAT LÄHIREITIT JA JURMUN SUUNTA

Kylmäpuron silta ennen kunnostusta ja sen jälkeen:



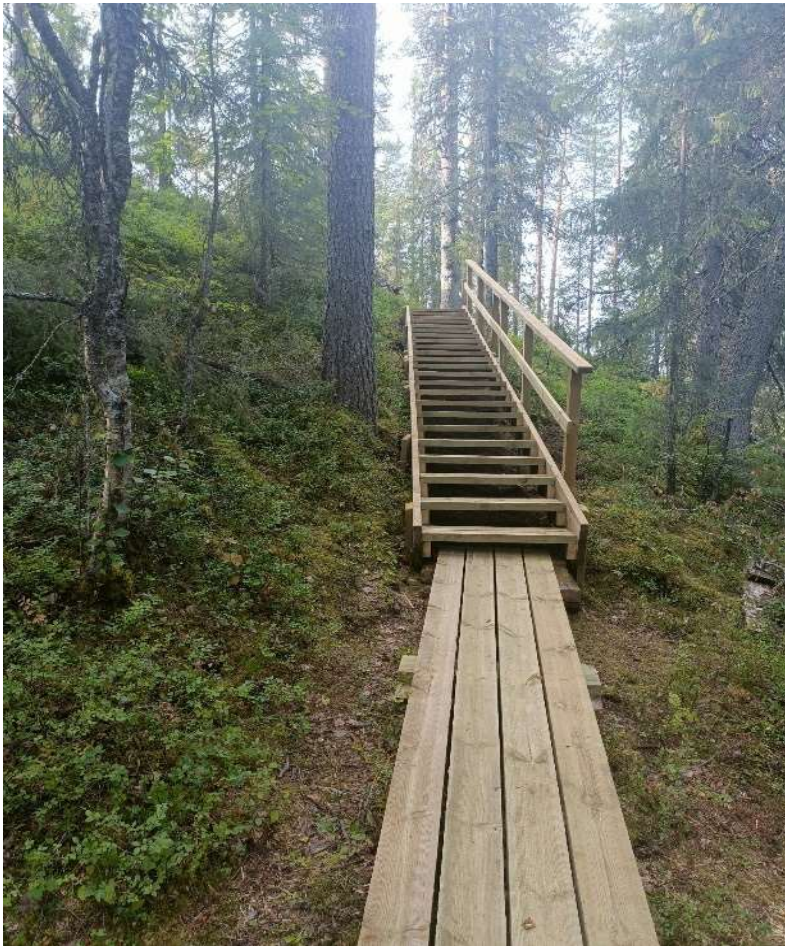

Kylmäpuroilta Turvakolle



Ala-Väkevän portaat:

Ennen:



Työmaan aikainen
reitti pyöräuralle



Nappaskenkäreitti



Nappaskenkäreittiä oli aiemmin kunnostettu pyöräiltäväksi.
Kuva vuodelta 2017, jolloin vielä pitkoslankut muutoin kunnossa.



Kivivaaran louhikon sorastus ja lankkusilta:



KUVAT SIMOSEN POLKU

Pitkokset ja sillat alkoivat jo katkeilla



Hankkeen ensimmäiset varsinaiset maastotyöt:
Simosenpolun pitkoksia ajetaan maastoon huhtikuussa 2022



Mursketta lastataan ajettavaksi Kantoniemen nuotiopaikalle
huhtikuussa 2023:



Vanha nuotiopaikka ja uuden pohja:



Kantoniemen niittyaluetta




Paula-myrsky kaatoi paljon puita Jokijärven alueelta,
mm Kantoniemeltä.

Kuvissa niittysauna ennen ja jälkeen kunnostuksen.
Sauna nostettiin, katto uusittiin ja aluetta kunnostettiin.



Uusia pitkoksia

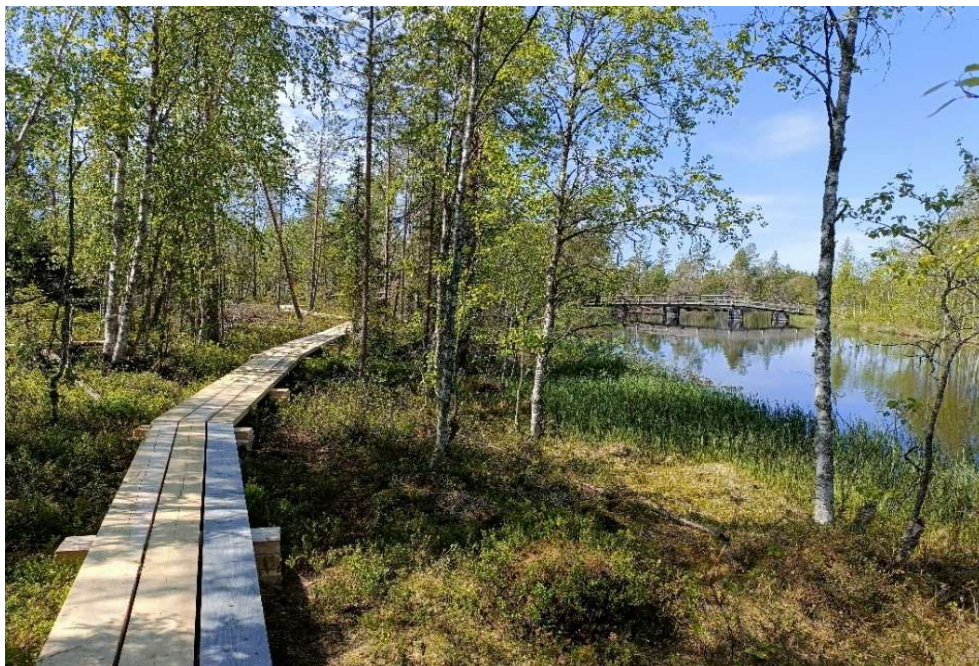

Kantoniemen kohdalta, sillan takana Kantoniemen niitty



Simosentie - Tyrälampi
väliltä



Isosuon eteläreunalta

Kantolammen uusi taulu kesällä 2024.
Uudet pitkokokset jo hieman harmaantuneet.



Taulun asennus Tyrälammen lintutornille kesällä 2023



Taulujen sisältöjä.

TYRÄLAMPI



Härkälintu
Podiceps grisegena

Tyrälampi on matala ja sitä luonnehtii runsas ilmaversoiskasvillisuus. Kortetta ja järviruokoa eli rytiä kasvaa ympäri rantavesiä tiheämpinä tai harvempina kasvustoina. Tornin edessä lahdensuulla on lisäksi tiheä kasvusto järvikaislaa, jota täkäläisissä vesissä esiintyy vain paikoittain. Rannoilla kasvaa heinämaista saraa. Keväällä lammen rannoilla kukkii keltakukkainen rentukka, myöhemmin kesällä rantaniityllä kukkivat mm. maariankämme, raate ja luhtakuusio. Kesikesällä avovedessä kukkivat valkokukkainen lumme ja keltakukkainen ulpukka. Ulpukkaa kutsutaan yleisesti lumpeeksi ja ne ovatkin lähisukulaisia. Kortteet on aikoinaan kerätty karjanrehuksi. Kortteiden niitto on suoritettu koraamalla, kesäisin vetelemällä pitkään varteen kiinnitetyllä viikatteenterällä läheltä pohjaa ja joskus myös syksyllä jään päällä. Lammen toisella puolella, tornia vastapäätä oleva Kärvänsiemikin on saanut nimensä kortteiden kuivaukseen käytetyistä kärväistä. Kärväs tehdään nuoresta männystä, jonka oksat jätetään kyynärän (n. 60 cm) pituiseksi tai pitemmiksikin ja kuivattavat heinät, kortteet tai viljalyhteet nostetaan niiden varaan. Kärväiden väliin voidaan myös laittaa riukuja, joilla lisätään kuivatuspinta-alaa. Rehuarvoltaan kortteet ovat olleet parempia kuin luonnonniittyjen heinät.

Matalassa ja runsaskasvustoissa Tyrälammissa viihtyvät vesilinnuista etenkin puolisukeltajat, yleisimpänä sinisorsa ja tavi. Sukeltajasorsista tavallisimpia ovat telkkä ja tukkasotka ja isompiä vesilintuja edustaa viime aikoina yleistynyt kansallislintumme laulujoutsen. Useimpina kesinä tornin viereisellä lahdella pesii uikkulintuihin kuuluva punertava ja vaaleaposkinen härkälintu, joka on täällä pesimäalueensa pohjoisrajalla. Hyvällä onnella voi kuulla sen soldinäätä, karkeaa räykkymistä joka usein huipentuu kimeään siankiljuntaan. Petolinnuista näkee yleisimmin komean sääksen eli kalasääksen kiertelemässä lammen yllä ja hyvällä onnella pääsee näkemään, kuinka se iskee rantavedestä särjen tai pienen hauen. Varhaiskevällä tornin läheisissä ruohikoissa kutevat hauet, myöhemmin särjet ja ahvenet. Tulvakeväänä kutuhaukia polskii tornin allakin.



MAARIANKÄMMEKÄ
Dactylorhiza maculata
ssp. *maculata*



LUHTAKUUSIO
Pedicularis palustris



ULPUKKA
Nuphar lutea

The grassy **Tyrälampi** pond is a versatile nature site. The shallow water is home to abundant vegetation such as horsetails, reeds, and many species of sedge, the common club-rushes that are seldom seen in these parts, yellow pond-lilies, water lilies, and marsh marigolds; heath spotted orchids, bog beans, and marsh louseworts bloom on the shore meadows.

Thanks to its shallow water, the pond is also home to a lot of birds, such as mallards, common teals, tufted ducks, and common goldeneyes, as well as whooper swans, the national bird of Finland. If you happen to be lucky, you may also hear the strange song of red-necked grebes here, or see an osprey hunting for fish in the pond. The bay is rich with fish such as pikes, and during spring floods, they can even be seen under this very tower due to the high waters. The pond has also been a source of fodder for cattle in the past. Horsetails from the pond were gathered to feed to cattle. The horsetails were cut down along the bottom of the pond using a scythe with a long handle, and then dried on a kärväs, a drying rack made from a young pine tree with its branches left intact.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahoitus:
Euroopan investoi maaseutualueisiin



TAIVALKOSKI



OLUJ
MAASEUTTI

KANTONIEMI

Tyräjoen rannoilla on ollut aikoinaan laajat niityt, joiden kasvua kevättulvat ovat ruokkineet.

Luo'olla – kuivalla säällä maahan levitettynä – kuivatut heinät on koottu latoihin tai suovin odottamaan kotinkuljetusta talven rekikeleillä. Aikoinaan täällä on ollut useiden talojen raivaamia erikokoisia rantaniityjä. Kun maat 1800-luvun isojaossa jaettiin uudestaan, jäi joenvarsi viiden talon haltuun, yksi iso lohko kullekin. Nykyisin niityistä on jäljellä ainoastaan saraa kasvavat vetisimmät rantakaistaleet. Vedessä kasvavaa kortettakin on aikoinaan kerätty karjanrehuksi. Kortteiden niitto on suoritettu koraamalla, kesäisin vetelemällä pitkään varteen kiinnitetyllä viikatteenterällä läheltä pohjaa ja joskus myös syksyllä jään päällä.


Tyräjoki on toiminut myös uittoväylänä, kun Tyrä- ja Koviojärven ympäristössä on ollut savotoita. Runsaan viiden kilometrin pituisessa Tyräjoessa on pudotusta ainoastaan toistakymmentä senttiä ja siltäkin suuri osa keskittyy muutamiin virtapaikkoihin, kuten Siikakariin ja Simosenkoskeen. Vedenjuoksun hitauden vuoksi kova tuulikin on vaikeuttanut puunjuoksua, etenkin kun Tyräjoella ei ole käytetty puomeja estämässä puita painumasta kiinni rantoihin. Myös kesän kuluessa lisääntyvä vesikasvillisuus on vaikeuttanut puun liikkuamista.

Joinakin keväänä lijoen vedenpinnan nopea nousu on kääntänyt Tyräjoen virtaamaan joksikin aikaa kokonaan toiseen suuntaan ja sellaisissa tapauksissa uittaminen tietenkin on mahdotonta. Väärään suuntaan virtaamista tapahtuu joskus nykyisinkin, mutta se on ollut yleisempää ennen linnin säännöstelypadon valmistumista 1960-luvulla.

Uitto on aiheuttanut rantaniityille polkemista ja roskaantumista johtuvia tuhoja. Puutavaran uittanut yhtiö on maksanut maanomistajille rantarahoiksi kutsuttua korvausta arviomiesten tekemien laskujen mukaan.




KORTTEEN KORAU



JOKIUITTO

River Tyräjoki flows from Lake Tyräjärvi to Lake Jokijärvi. This five-kilometre river only has a drop of a little over 10 centimetres, and even that is focused at few key flow sites. Some springs, the rapid rise in the water levels of River Iijoki has completely reversed the direction of flow in River Tyräjoki. Springtime floods have nourished the vast shore meadows, where grass was harvested into haystacks and waterside barns; during the winter, it would be then brought home on a sled to feed the cattle.

The river was used for floating logs from the logging sites on the shores of Lake Koviojärvi and Lake Tyräjärvi. Due to the slow flow of its waters, even high winds could slow down wood transportation, as could the vegetation on its banks that would grow thicker and thicker as the summer went on.



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahoitus:
Euroopan investoi maaseutualueisiin



TAIVALKOSKI



OLUJ
MAASEUTTI

KUVAT KYLMÄLUOMA - TAIVALKOSKI ja MYRSKYTUHOT

Kulunutta Salmisenkangasta:



Samaa seutua sorastettuna:



Toinen kuvapari samalta suunnalta:



Väljoen silta ennen ja jälkeen jatkamisen:



Harjajärven-Salmisenkankaan seudulla reitti menee useassa kohdassa kelkkauraa, jonka Metsähallitus kunnosti.

Lähtö Harjajärventieltä Salmisenkankaalle:



MYRSKYVAURIOITA KYLMÄLUOMAN REITILLÄ

Susijärvi



Harjajärvi

Laajasti kaatuneita puita reitillä hankalassa maastossa.

(kuvat eivät näytä tilannetta pahimmillaan)

Reitti jouduttiin siirtämään eikä suunniteltuja kunnostuksia voitu toteuttaa.



KUVAT OPASTEISTA

Simosenpolun vanhoja opastetauluja



A0 Romppasensalmi,
Tilalle uusi taulu metallijaloin

Kylätalon taulu vanhoin jaloin

Saijantien taulut,
tilalle uudet puutelineet ja uusi AO taulu



Vanhoja viittaryhmiä



Uusia viittoja lajitellaan asennettaviksi syksyllä 2023



Uusi A0-opastustaulu Melontakeskukseen syyskuussa 2024



Jokijärven Kylätalon uusittu puuteline ja lisätty Simosenpolun taulu



Uusia viittaryhmiä



Ohje- ja varoitustaulut



Laavujen vanha ja uusi taulu



Tervetuloa

Pirinjärven kodalle



Ylläpitäjä / administrator

TAIVALKOSKEN KUNTA
- Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
p. 0400 126 455

Varanumero

kiinteistöpäivystäjä
p. 0400 126 452



Täällä voit pitää tauon retkesi lomassa. Viipyä voit korkeintaan yhden yön yli. Pidempiaikainen leiriytyminen on kielletty.

Ansiotoimintaan näitä rakenteita ja polttopuita käyttävien yrittäjien ja tapahtumajärjestäjien on sovittava käytöstä erikseen Taivalkosken kunnan kanssa.

Muistathan

- pitää tulta vain sitä varten rakennetussa nuotiopaikassa
- käyttää nuotiossa ainoastaan siihen varattua polttopuuta ja välttää tarpeetonta puun polttoa
- olla varovainen tulen käsittelyssä ja sammuuttaa nuotion lähtiessäsi.

Huomioithan muut käyttäjät

- pilkkomalla syttöpuut valmiiksi seuraavalle käyttäjälle
- huolehtimalla omalta osaltasi paikan siisteydestä.

Pienen määrän palavia jätteitä, kuten puhdasta eväspaperia tai pahvia, voit polttaa nuotiossa ja eloperäisiä jätteitä jättää käymälän kompostoivaan alusastiaan. Vie muovit, metallit ja lasit mukanasi kierrätykseen ja muu sekajäte sille kuuluvaan paikkaan.

KAIKEN MINKÄ JAKSAT KANTAA MAASTOON, JAKSAT VARMASTI TUODA SIELTÄ POISKINI!

Vieraskirja

Käyntimerkintä (päiväys, nimi ja retkesi seuraava kohde) auttavat pelastuspalvelua hätätilanteissa ja epäkohdista ilmoittaminen nopeuttaa korjausten järjestämistä. Voit myös perinteiseen malliin kirjoittaa vihkoon.



Vieraskirja
Quest book



Palautte
Feedback



Here you can take a break from your trip or stay for a maximum of one night.

Remember

- You can only have a fire in a built-in fire pit, using only firewood reserved for that purpose.

When you leave, please make sure that the campfire is carefully extinguished and that you do not leave any trash behind.

HUOMIO!

METSÄPALOVAROITUKSEN
AIKANA ON AVOTULEN TEKO
KOKONAAN KIELLETTY,
MYÖS HUOLLETUILLA PAIKOILLA.



ATTENTION! OPEN FIRE IS COMPLETELY
PROHIBITED DURING A FOREST FIRE WARNING.

SOS 112

Paikannuspiste / Location
Pirinjärven kota
Taivalkoski

65° 33.45 N
27° 54.35 E

Quest book

Marking your visit (date, name and the next destination of your trip) helps the rescue service in emergency situations, and reporting faults speeds up the organization of repairs.



Katso myös reittikuvaukset:
OutdoorActive

outdooractive.fi/fi/matkaopas/suomi/taivalkoski/24015029/



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahoisto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin

MAINOS
KESKUS




Taivalkosken kunta

65° 30.17 N
28° 35.69 E

[illegible]

65° 33.16 N
28° 09.59 E

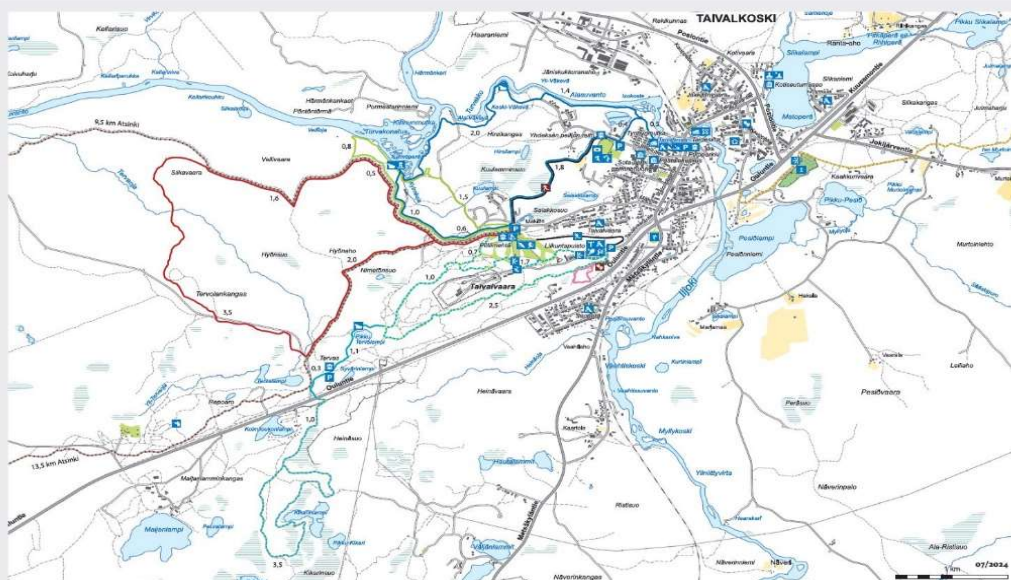

	• Skattemæssig kapital	5,5 km
	• Værdipapiraktiver	8 km
	• Realkapital	9 km
	• Offentl. finansinvesteringer	1 km
	• Andet	1 km
	• Udvalgte aktiver	20,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer (inkl. afholdt afkast)	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km
	• Tilførselsfinansinvesteringer	5,5 km



**Tätä kohdetta on tuettu
Manner-Suomen
maaseudun
kehittämisohjelmasta
2014-2020**

**TAIVALKOSKEN MONITOIMIREITTIIEN KEHITTÄMISHANKE
2021 – 2023**

Hankkeen tavoitteena Taivalkosken kunnan ylläpitämien luontoliikuntareittien kokonaisvaltainen uudistus ja päivittäminen vastaamaan tämän ajan vaatimuksia. Toimenpiteillä parannetaan reittiverkoston näkyvyyttä, saavutettavuutta, käyttöturvallisuutta ja monikäyttöisyyttä.

Merkittävimmät toimenpiteet ovat kattava opastuksen uudistaminen sekä reittirakenteiden ja reittien kunnostus ja kestävyystarvikkeiden mm sorastuksien ja pitkoksien uusien.

Reittien kehittämisellä lisätään Taivalkosken ja sen kylien alueellista kiinnostavuutta, tuoden esille laajan pitäjän olemassa olevia piirteitä sekä parantaa maaseudun pienten yritysten toimintaedellytyksiä. Reittien kehitys ja infrastruktuurin parantaminen tarjoaa Taivalkosken vakituksille- ja vapaa-ajanasukille ja matkailijoille entistä parempia virkistys- ja lähiliikunta-alueita sekä tarjoaa puitteita maaseudun yrityksille kehittää luontoon liittyvää liiketoimintaa ja kehittää sitä kautta haja-asutusalueiden tasa-arvoisuutta.

Hankkeen toteuttaa Taivalkosken kunta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 200 000€ista mistä ELY-keskuksen rahoitusosuus 70%.

Lisätiedot: projektipäällikkö Ulla Majava ulla.majava@taivalkoski.fi puh 040 860 9042



Euroopan maaseudun
kehittämisen maatalousrahasto:
Eurooppa investoi maaseutualueisiin



Elinkeino-, liikenne- ja
ympäristökeskus



MAASEUTU 2023
